

AGOSTO 2020


La sfida comincia

11.08.2020 Aggiudicazione dei lavori e autorizzazione alla cantierizzazione e alla preparazione dell'area per la posa dei prefabbricati (Ordinanza RAVA n. 3/2020)

20.08.2020 Consegna elaborati progetto esecutivo

25.08.2020 Approvazione progetto esecutivo (che costituisce anche titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi) e autorizzazione all'inizio dei lavori (Ordinanza RAVA n. 12/2020)

Nel corso del mese di agosto viene effettuata la cantierizzazione dell'area, la predisposizione della platea di fondazione del primo blocco di 15 aule e la posa delle pareti e del tetto del primo modulo scolastico.

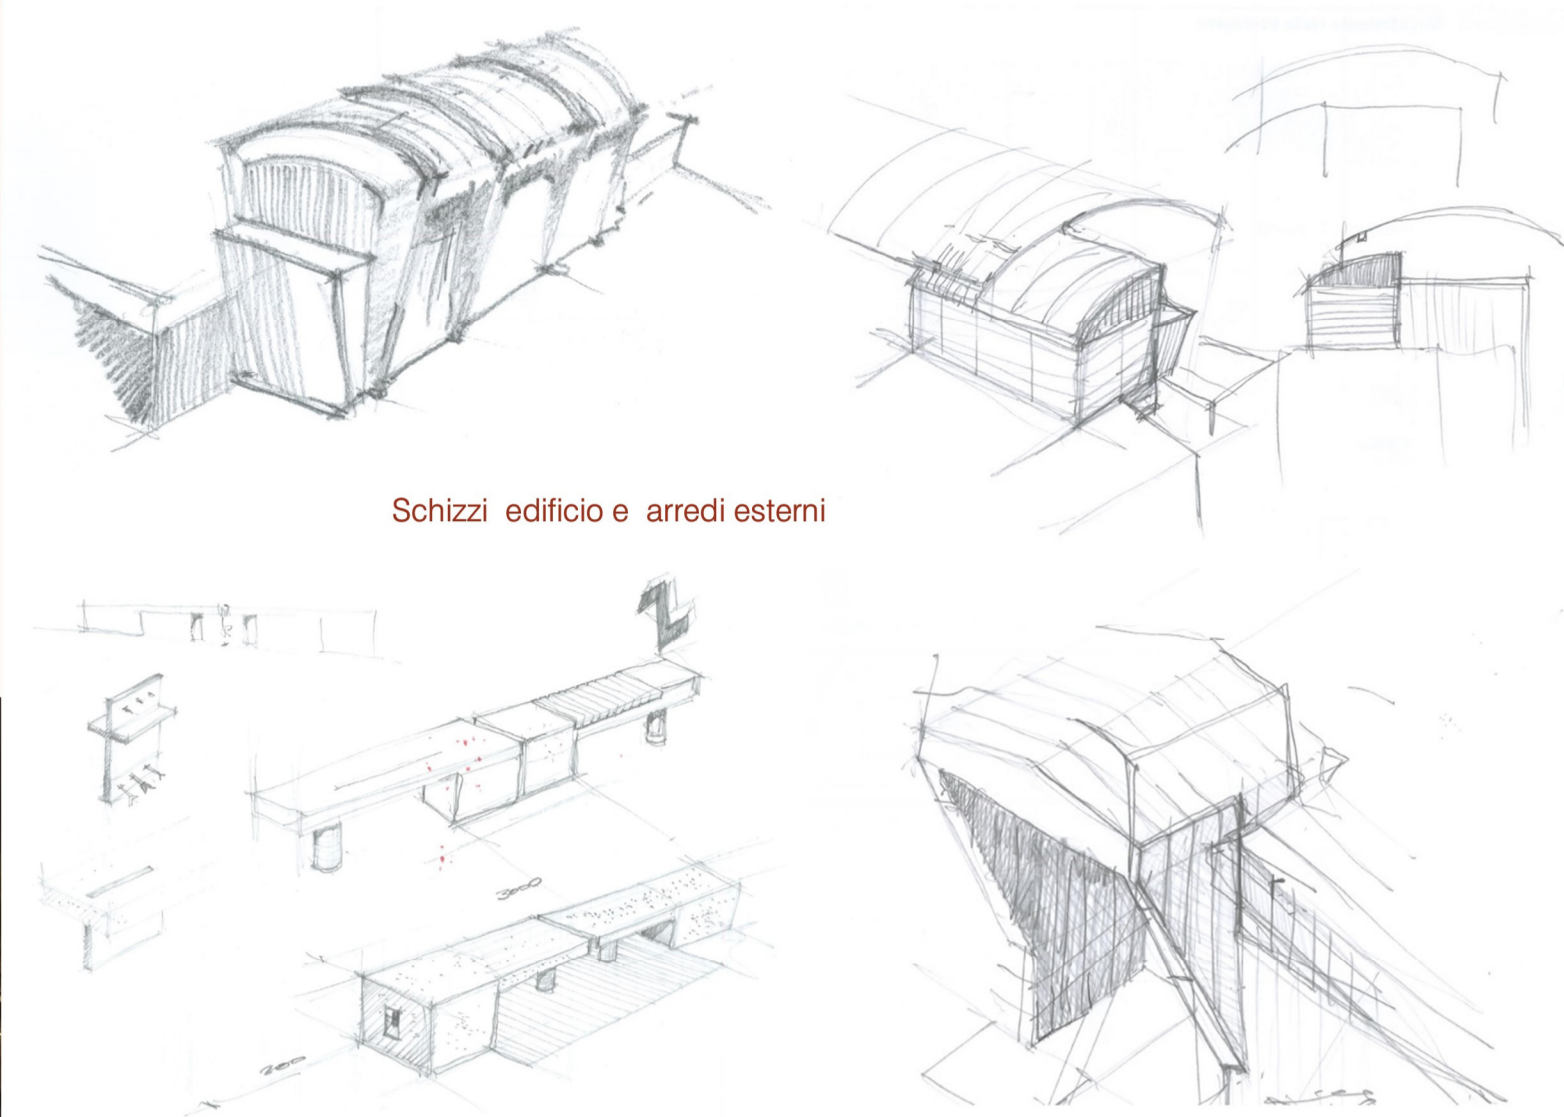

Schizzi edificio e arredi esterni



Blocco A1 in costruzione

SETTEMBRE 2020

La consegna delle prime 15 aule

10.09.2020 Fine lavori primo blocco A1 di aule

10.09.2020 Collaudi primo blocco A1 di aule, SCIA parziale VF e agibilità blocco A1

11.09.2020 Presa in consegna delle opere da parte della Regione Valle d'Aosta

14.09.2020 I primi 300 alunni del Liceo Bérard entrano nella nuova scuola

I prefabbricati modulari venivano preparati nello stabilimento della Chenevier, distante circa 5 km, e portati in cantiere per l'assemblaggio.

A mano a mano che la struttura veniva ultimata venivano posati in sequenza gli impianti e i rivestimenti interni ed esterni.

Mentre il primo blocco di aule veniva ultimato è stata realizzata la platea di fondazione per il secondo blocco modulare di 15 aule. Consegnato il blocco A1 è iniziata la posa dei moduli prefabbricati del blocco A2

OTTOBRE 2020

La consegna del secondo blocco di aule, degli uffici e dei laboratori

15.10.2020 Fine lavori secondo blocco A2 di 15 aule

15.10.2020 Collaudi secondo blocco A2 di aule, SCIA parziale VF e agibilità blocco 2

16.10.2020 Presa in consegna delle opere da parte della Regione Valle d'Aosta

19.10.2020 Altri 300 studenti entravano in aula

30.10.2020 Fine lavori blocchi modulari C e D con uffici

30.10.2020 Collaudi blocchi C e D, SCIA parziale VF e agibilità blocchi C e D

30.10.2020 Presa in consegna delle opere da parte della Regione Valle d'Aosta

Durante l'ultimazione del secondo blocco A2 di n. 15 aule, venivano già montati i blocchi B e C comprendenti l'atrio principale della scuola, n. 7 uffici per il personale amministrativo e docente, n. 5 aule e n. 2 laboratori, oltre a locali tecnici e spazi connettivi.

Venivano inoltre completate le sistemazioni esterne nelle aree circostanti le aule dei blocchi A1 e A2, con anche arredi, inerbimento e piantumazioni.



Blocchi uffici, laboratori e ultime aule in costruzione

DICEMBRE 2020

L'ultimazione dei lavori e la consegna finale

19.12.2020 Fine lavori complessiva degli archivi e delle sistemazioni esterne

22.12.2020 Collaudi finali, SCIA VF complessiva e agibilità finali


22.12.2020 Presa in consegna complessiva delle opere da parte della Regione Valle d'Aosta

Il complesso scolastico è ultimato e completamente funzionante per Natale!

In soli 116 giorni dall'inizio dei lavori sono stati realizzati 4.088,00 m2 di superficie coperta, oltre 4.000,00 mq di aree verdi e sistemazioni esterne e sono state messe a dimora oltre 700 piante tra alberi e arbusti.



Complesso ultimato

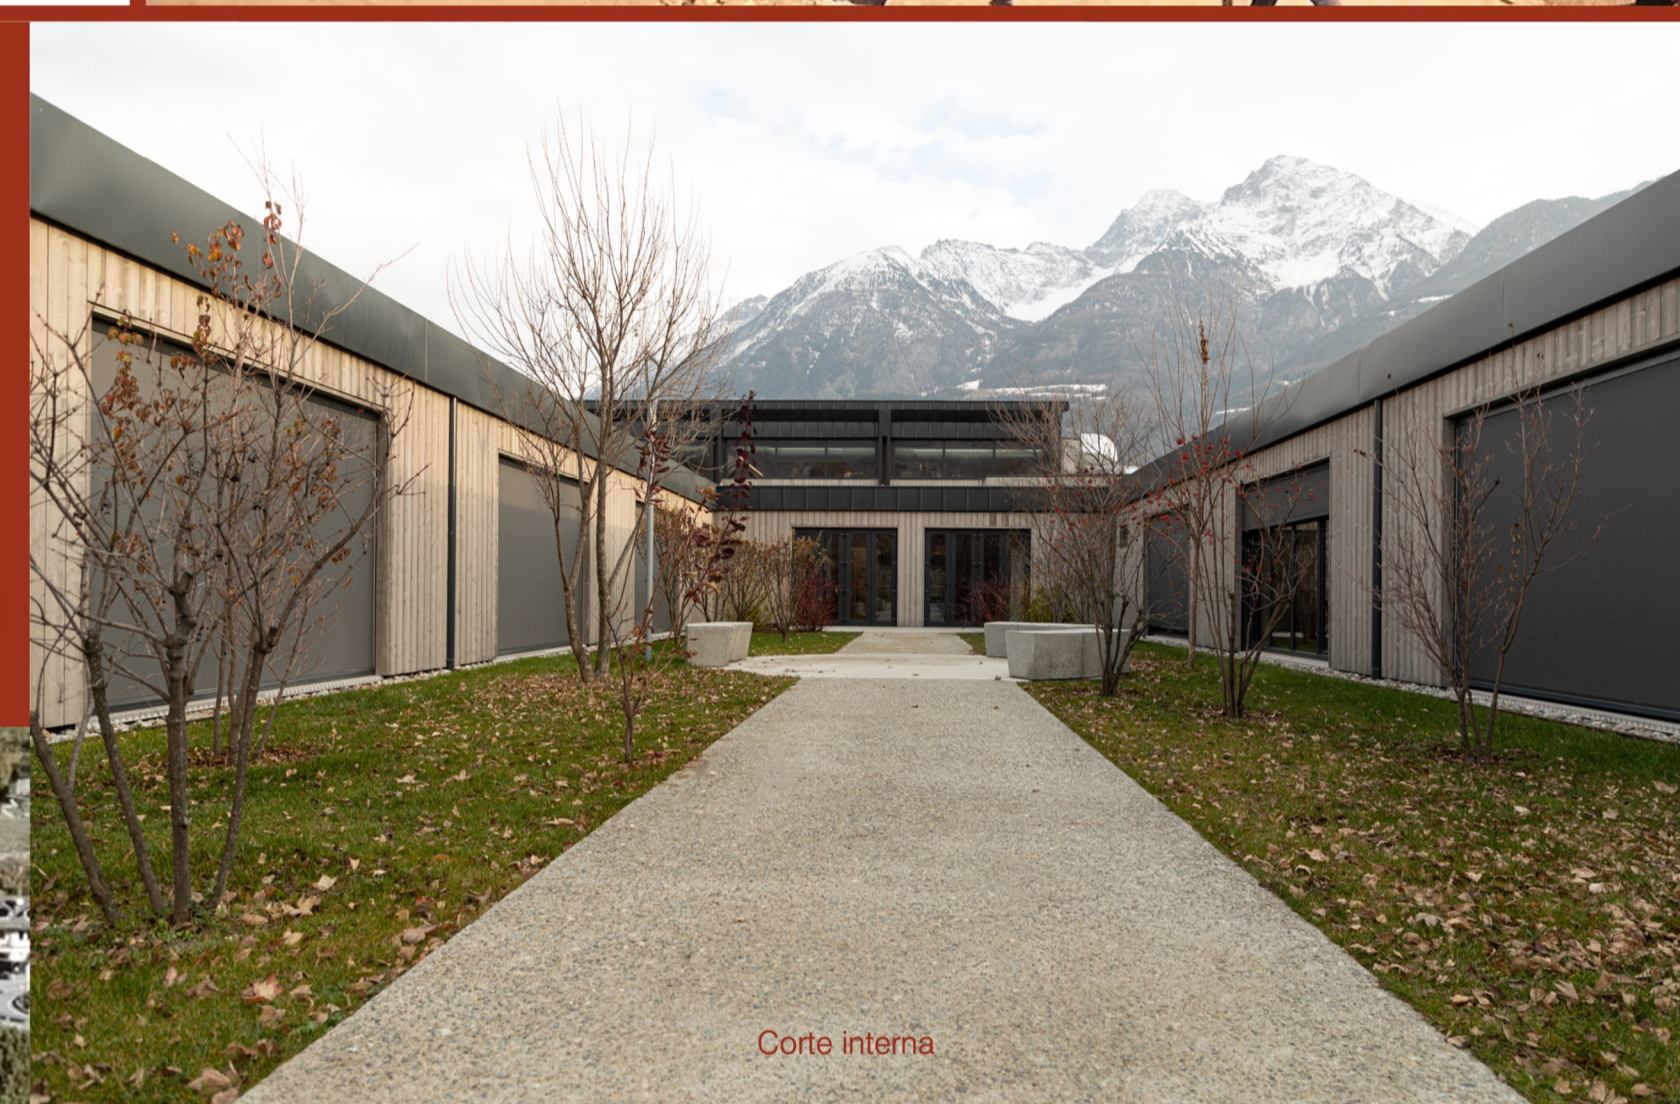

Corte interna



Blocco A1 agibile

Blocco A2 in costruzione



Palestra in costruzione



Blocchi uffici, laboratori e ultime aule in costruzione

NOVEMBRE 2020

L'ultimo passo: la palestra

30.11.2020 - Fine lavori del blocco D - palestra

Durante i lavori di realizzazione dell'ultimo blocco D, la palestra, i 700 studenti, il personale amministrativo e il corpo docente usufruivano dell'edificio scolastico nella sua totalità.

Nel corso del mese di novembre sono state inoltre completate le sistemazioni esterne, comprensive di modifiche della viabilità, parcheggi, pavimentazioni, arredi esterni, e realizzato un archivio non inizialmente previsto.



Palestra in costruzione
