CRONOPROGRAMMA

www.studiomaina.it

by studio tecnico franco maina
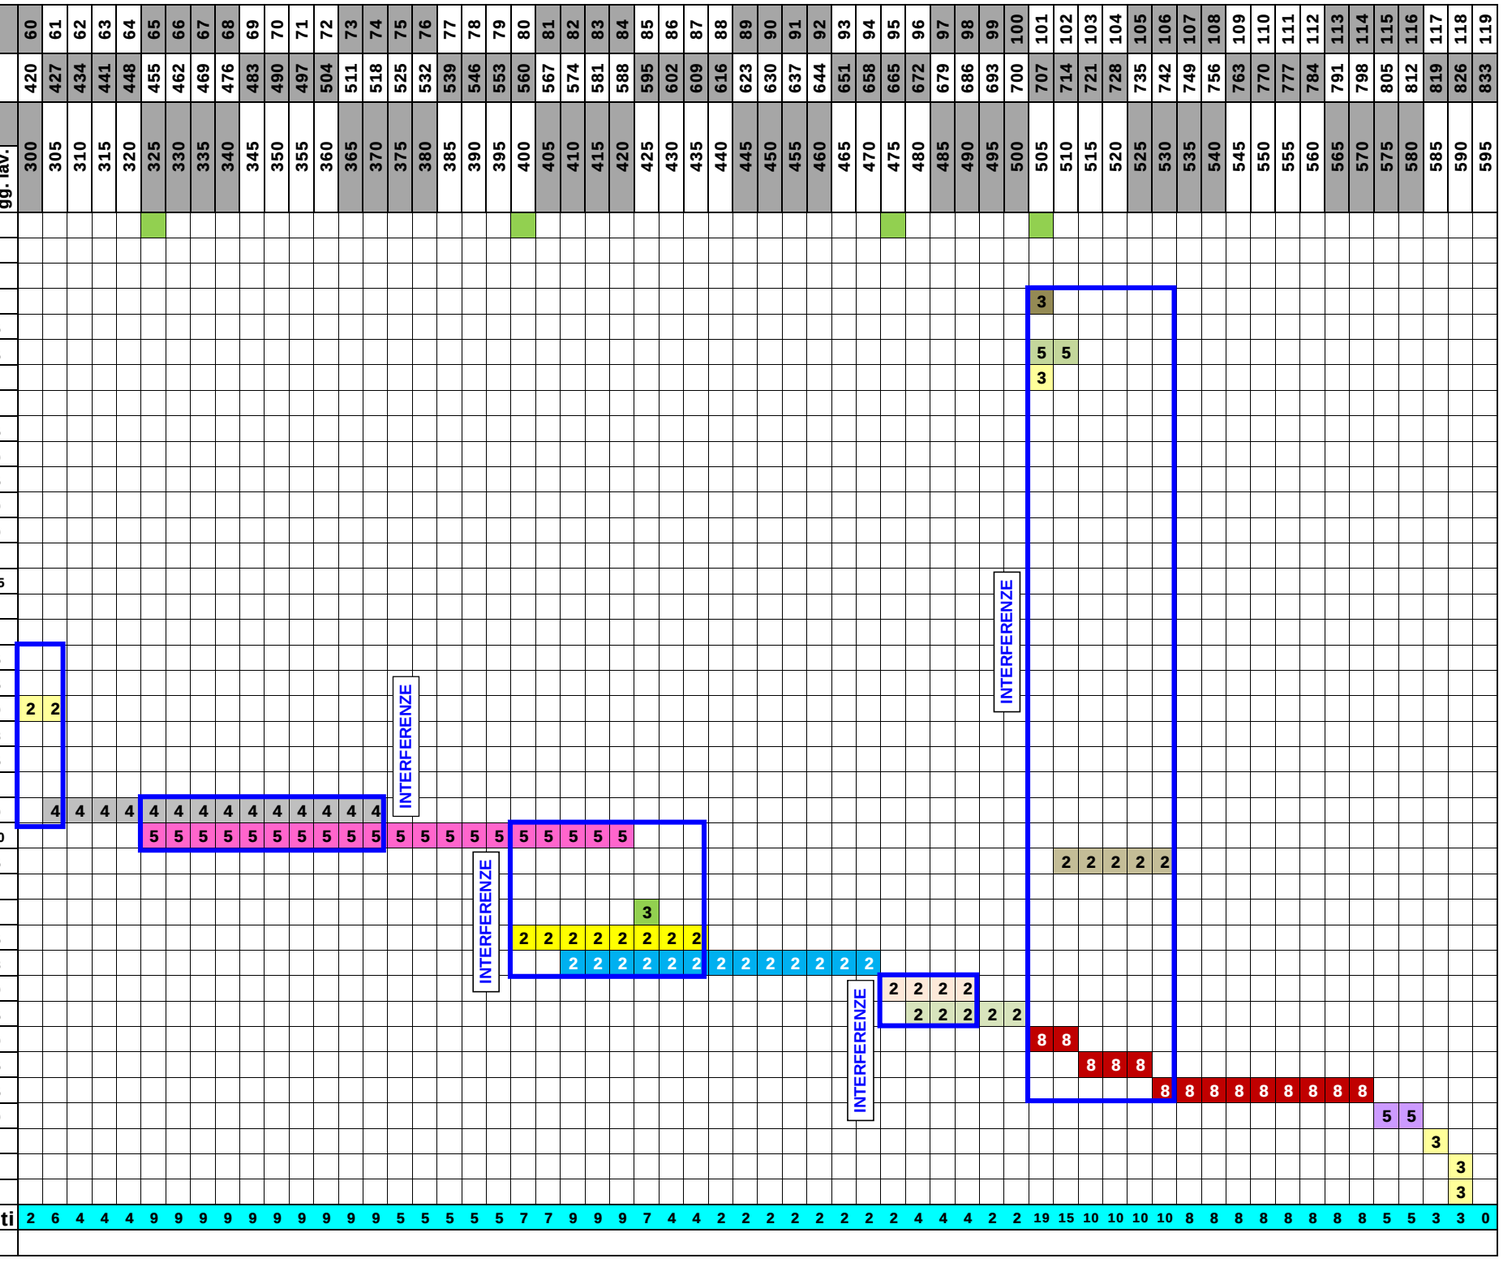
n. fase	ATTIVITÀ/FASI	settimana INIZIO	settimana FINE	durata gg. lav.
	RIUNIONI DI COORDINAMENTO CONVOCATE DAL CSE			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	1	1	5
2	MONTAGGIO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	15	15	5
2	SMONTAGGIO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	101	101	5
3	MONTAGGIO OPERE PROVVISIONALI E DPC	23	37	75
3	SMONTAGGIO OPERE PROVVISIONALI E DPC	101	102	75
4	DEMOLIZIONI MANUALI	101	101	5
5	DEMOLIZIONI MECCANICHE	1	1	5
6	PALIFICATE REGGISCAVO	2	10	45
7	OPERE DI SCAVO	11	14	20
8	REALIZZAZIONE OPERE DI FONDAZIONE	15	19	25
9	REALIZZAZIONE VESPAI	18	19	10
10	REALIZZ. OPERE IMPERMEABILIZZAZIONE	21	22	10
11	REAL. REINTERRI, COMPATTAMENTO TERRENO	22	22	5
12	REAL. STRUTTURE VERTICALI ED ORIZZONTALI IN C.A.	20	42	115
13	REALIZZAZIONE LATTONERIE	41	41	5
14	REALIZZAZIONE LINEE VITA PERMANENTI	41	41	5
15	REALIZZAZIONE MURATURE	43	53	55
16	ASSISTENZA IMPIANTI	55	59	25
17	POSA DAVANZALI, SOGLIE E COPERTINE	60	61	10
18	REALIZZ IMP IDROTERMOSANIT., CLIMATIZ. CANNE FUM. E ESALAZ., FOGNARIE	45	58	68
19	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, TELEF. CITOF. TV -FOTOVOLTAICO	52	60	45
20	REALIZZAZIONE ASCENSORE	55	55	5
21	REALIZZAZIONE DI INTONACI	61	74	70
22	POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI COMPRESO MASSETTO	65	84	100
23	DECORAZIONI - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	102	106	25
24	COMPLETAMENTO IMPIANTI	/	/	
24.1	messa in esercizio ascensori e montacarichi	85	85	5
24.2	posa cavi, prese, quadri, punti luce, antenne, parabole, lampade,fotovoltaico	80	88	45
24.3	posa elementi radianti, rubinetteria, apparecchi sanitari, pannelli solari ecc	82	95	68
25	POSA SERRAMENTI E VETRATURE	95	98	20
26	OPERE DA FABBRO	96	100	25
27	REALIZZ. RECINZIONE DELLA PROPRIETA'	101	102	10
28	ADDUZIONE E SCARICHI	103	105	15
29	FORMAZIONE AREE VERDI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA	106	114	45
30	REALIZZAZIONE PIATTAFORMA STRADALE E DOSSO	115	116	10
31	SEGNALETICA STRADALE ORIZZ. E VERT.	117	117	5
32	COLLAUDO LAVORI	118	118	5
33	RIMOZIONE DEL CANTIERE	118	118	5
	totale lavoratori presenti
